FOLKETINGET
RIGSREVISIONEN

September 2026

Rigsrevisionens notat om beretning om

Energinets udbygning af elnettet

Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 12/2025 om Energinets udbygning af elnettet

Klima-, energi- og forsyningsministerens redegørelse af 27. juli 2026

26. august 2026

RN 1502/26

1. Rigsrevisionen gennemgår i dette notat de initiativer, som klima-, energi- og forsyningsministeren vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Dette sker med henblik på at vurdere, om ministeriets og Energinets initiativer adresserer den kritik, der fremgår af Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens beretning.

Ministeren nævner i sin redegørelse initiativer vedrørende den generelle kapacitetsudfordring i elnettet, som de har erkendt efter vores undersøgelse. Vi følger kun op på initiativer vedrørende forsinkelser i udbygningen af elnettet, da det er disse, som vores beretning omhandler.

Konklusion


Rigsrevisionen finder, at ministeren har redegjort for, hvordan ministeriet og Energinet vil følge op på Statsrevisorernes bemærkninger og de væsentligste kritikpunkter i beretningen.

Ministeren oplyser, at hun ser med stor alvor på Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens beretning. Hun finder ikke, at forsinkelserne i Energinets projekter er acceptable. Ministeren beskriver flere initiativer, som skal understøtte, at Energinet øger hastigheden i udbygningen af elnettet, og som skal styrke ministeriets tilsyn.

Rigsrevisionen vil følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

- Energinets arbejde med at sikre, at andelen af forsinkede projekter lever op til Energinets egne måltal, så 60 % af alle projekter er uden forsinkelser i 2030. For projekter, der er godkendt fra 1. januar 2025 og frem, er målet min. 70 %.
- Energinets arbejde med at sikre, at de lever op til deres egne mål om, at budgettet bliver overholdt for mindst 70 % af de projekter, der er godkendt fra 1. januar 2025 og frem.
- Energinets løbende opfølgning på, hvor hurtigt elnettet bliver udbygget.

Sagsforløb for en større undersøgelse

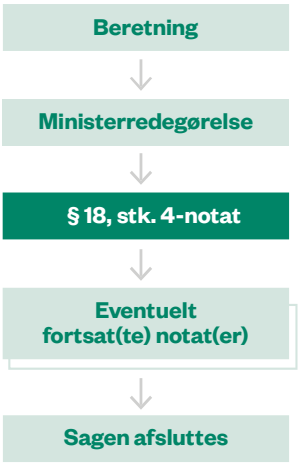

Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på www.rigsrevisionen.dk

- Energinets arbejde med at følge årsagerne til forsinkelser og løbende opbygge et årsagsarkiv.
- Ministeriets arbejde med både at styrke deres rolle som ejer og ændre deres tilsyn med Energinet.
- Ministeriets arbejde med at få gennemført en ekstern analyse af rammerne for Energinet på baggrund af et oplæg, der er under udarbejdelse.
- Ministeriets arbejde med at udvikle deres metoder til at vurdere elnettets betydning for udledning af CO_2, når de udarbejder den årlige rapport om klimastatus og -fremskrivning.

I. Baggrund

2. Rigsrevisionen afgav i april 2026 en beretning om Energinets udbygning af elnettet. Beretningen handlede om Energinets styring og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets tilsyn.

3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de Energinets styring af udbygningen af elnettet kritisabel. Ca. 70 % af de igangsatte udbygningsprojekter er forsinkede, og Energinet har kun delvist overblik over årsagerne.

Statsrevisorerne kritiserede, at ministeriet har reageret for sent i deres tilsyn, selv om forsinkelserne har været stigende.

4. Hele sagen kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på www.ft.dk/Statsrevisorerne.

5. Bilag 1 viser Folketingets behandling af beretningen.

II. Gennemgang af ministerens redegørelse

Energinets styring af udbygningen af elnettet

Omfanget af forsinkelser

6. Statsrevisorerne kritiserede, at ca. 70 % af de igangsatte udbygningsprojekter er forsinkede. De bemærkede, at Energinet systematisk har undervurderet, hvor lang tid det tager at gennemføre deres projekter. De bemærkede også, at den hastighed, elnettet bliver udbygget med, skal mere end fordobles fra 120 km til 250 km årligt, hvis Energinet skal nå den forventede udbygning i 2050.

7. Ministeren er overordnet enig i kritikken. Hun oplyser, at Energinet anerkender, at udbygningen er forsinket og fordyret i forhold til de oprindelige planer. Hun noterer sig, at Energinet har sat tiltag i gang, som skal styrke projektstyringen og øge hastigheden i udbygningen af elnettet. Det drejer sig bl.a. om digitalisering af anlægsprocessen og forbedrede indkøb. Energinet har også opdateret den måde, hvorpå de udarbejder tidsplaner og budgetter. Ministeren oplyser også, at Energinet kvartalsvist orienterer ministeren og Folketinget om status i et offentligt tilgængeligt porteføljeoverblik over projekter, jf. politisk aftale herom fra januar 2026.

Ministeren oplyser, at Energinet i forlængelse af de igangsatte tiltag har sat mål om, at 60 % af alle projekter skal være uden forsinkelser i 2030. For nye projekter, der er godkendt fra 1. januar 2025 og frem, er målet min. 70 %. Energinet har også sat mål om, at det i 2030 skal være mindst 70 % af de projekter, der er godkendt fra 1. januar 2025 og frem, der skal være gennemført inden for det godkendte budget.

Ministeren oplyser, at Energinet ikke vil følge antallet af fuldførte kilometer elnet som mål for, hvor hurtigt elnettet bliver udbygget. Energinet anfører, at det ikke er et retvisende mål for, om udbygningen svarer til efterspørgslen. De vil i stedet benytte andre mål i den løbende opfølgning. Disse mål er ikke udarbejdet.

8. Vi vil følge Energinets arbejde med at sikre, at andelen af projekter uden forsinkelser og med budgetoverholdelse lever op til Energinets egne måltal. Vi vil også følge, hvordan Energinet både internt og i den kvartalsvise rapportering til Folketinget følger op på, hvor hurtigt elnettet bliver udbygget.

Årsager til forsinkelserne

9. Statsrevisorerne bemærkede, at Energinet angiver både interne og eksterne forhold som årsager til forsinkelser. De bemærkede også, at Energinets årsagsforklaringer ikke er entydige og ikke viser, hvordan Energinet kan undgå fremtidige forsinkelser.

Energinet er ikke enige i, at der mangler overblik over årsagerne til forsinkelserne, idet de oplyser, at de har etableret systematisk registrering af årsagerne. Ministeren nævner desuden, at årsagerne fremgår af det porteføljeoverblik, der forelægges Folketinget. Som det fremgår af beretningen, har Energinet arbejdet på at forbedre deres registreringspraksis i forhold til, hvad de gjorde i undersøgelsesperioden. Energinet har i modsætning til tidligere delt årsagerne til forsinkelser op, og medio 2025 indførte de et digitalt årsagsarkiv. Da beretningen blev afgivet, var det for tidligt for os at vurdere Energinets initiativer, da der kun forelå data for ét kvartal. Vi vil vurdere initiativerne, når der foreligger data for en længere periode.

10. Vi vil følge Energinets arbejde med at følge årsagerne til forsinkelser og løbende opbygge et årsagsarkiv.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets tilsyn med Energinets udbygning af elnettet

Ministeriets tilsyn og reaktion på forsinkelser

11. Statsrevisorerne bemærkede, at ministeriet gentagne gange siden starten af 2023 er blevet gjort opmærksom på store og stigende forsinkelser i Energinets projekter. De bemærkede også, at ministeriet har reageret for sent på de informationer, som de har fået gennem deres tilsyn.

12. Ministeren er enig i, at der er reageret for sent, og at der tidligere burde have været igangsat et intensiveret tilsyn med Energinets udbygning.

Ministeriet har derfor i januar 2026 ændret deres interne organisering for at styrke deres rolle som ejer af Energinet. De har også indført en fast procedure for opfølgning på de informationer, der tilgår ministeriet om Energinet, og de har som ejer fastsat nye måltal for Energinet. Endelig har ministeriet opdateret retningslinjer, mødeformater, materialer mv.

Ud over de initiativer, som ministeriet har gennemført som ejer af Energinet, har de kortlagt Energistyrelsens tilsyn med Energinet. Kortlægningen skal føre til ændringer i tilsynet, der understøtter efterlevelsen af ministeriets tilsynsforpligtelse, bl.a. ved at tydeliggøre rolle- og ansvarsfordelingen. Ministeriets nye tilgang til tilsyn med Energinet forventes fuldt implementeret i 2026.

13. Vi vil følge ministeriets arbejde med både at styrke deres rolle som ejer og ændre deres tilsyn med Energinet.

Ekstern analyse

14. Statsrevisorerne bemærkede, at ministeriet primo februar 2026 har taget initiativ til at igangsætte en ekstern analyse af rammerne for Energinet. Rigsrevisionen fandt, at dette kunne have været igangsat tidligere.

Ministeren er enig i behovet for opdaterede rammer for Energinet, og hun er i positiv over for at igangsætte en analyse, der kan belyse, om der er behov for at opdatere de regulatoriske og styringsmæssige rammer for Energinet.

15. Ministeren oplyser, at analysen ikke nåede at blive sat i gang inden folketingsvalget i marts 2026. Hun oplyser også, at den nye regering ikke har taget endelig stilling til scope for en analyse. Ministeren ser en ekstern analyse som et relevant redskab. Hun har derfor bedt ministeriet om at udarbejde et oplæg til indhold og tidsplan for en analyse.

16. Vi vil følge ministeriets arbejde med at få gennemført en ekstern analyse af rammerne for Energinet på baggrund af det oplæg, der er under udarbejdelse.

Ministeriets overblik over, hvad forsinkelserne betyder for de politiske mål på klimaområdet

17. Statsrevisorerne bemærkede, at ministeriet ikke har beregnet, hvad Energinets forsinkelser betyder for udledningen af CO_2 eller for tilslutningen af nye solcelle- og vindmølleparker. De var enige i Rigsrevisionens anbefaling om, at ministeriet bør undersøge konsekvenserne af Energinets forsinkelser nærmere.

18. Ministeren anerkender, at Energinets forsinkelser kan have konsekvenser for den grønne omstilling. Hun oplyser, at det er vanskeligt at opgøre effekten, da forsinkelser kan have forskellige og modsatrettede effekter på udledningen af CO_2. Hun oplyser også, at ministeriet løbende undersøger mulighederne for at udvikle de metoder, der bliver brugt til den årlige rapport om klimastatus og -fremskrivning, herunder i forhold til elnettets betydning.

19. Vi vil følge ministeriets arbejde med at udvikle deres metoder til at vurdere elnettets betydning for udledningen af CO_2, når de udarbejder den årlige rapport om klimastatus og -fremskrivning.

Birgitte Hansen
rigsrevisor

Bilag 1. Folketingets behandling af beretningen

Beretning (nr.), dato for Statsrevisorernes mødebehandling og ministerredegørelse(r)	Behandlet i udvalg	Gennemgang ved Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	Udvalgsspørgsmål (nr.)	Indkaldt til samråd	Statsrevisorerne har holdt møde med ministeren	§ 20-spørgsmål
Energinets udbygning af elnettet (nr. 12/2025) 09-04-2026 **Ministerredegørelse:** Klima-, energi- og forsyningsministeren: 27-07-2026 Udtalelse fra Energinet: 22-07-2026	Finansudvalget: 07-05-2026		Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget: 10-06-2026 (1) 10-06-2026 (2) 10-06-2026 (10)			
